

Итоговая презентация реализации проекта

БЕРЕЖЛИВАЯ ШКОЛА

«Оптимизация системы подачи ППУ»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина», г. Елец

Система подачи ППУ

21.09.2024

Команда проекта



Заказчик проекта
Кузовлева Н.В.



Владелец проекта
Шевченко Е.И.



Руководитель проекта
Барабанщикова Е.В.



Милякова А.Л.



Леденева Э.А.



Почитаева Н.Н.



Понарина О.С.



Харькова Р.А.

Результаты входного анкетирования



Обоснование выбора

Проанализировав итоги анкетирования №1, а также принимая во внимание дополнительные факторы (финансирование, обеспеченность ресурсами, состояние основных фондов учебного заведения и т.п.) руководителем учебного заведения принято решение:

в качестве направления для реализации в рамках проекта «Бережливая школа» выбрать направление «Система подачи ППУ»

Результаты дополнительного анкетирования по удовлетворенности процессом «Система подачи ППУ» показали:

- участники образовательного процесса готовы вносить свои идеи по улучшению;
- не знают к кому обратиться со своими предложениями из-за непонимания схемы их подачи;
- не знают о том, какие ещё предлагаются идеи, не имеют возможности вносить свои предложениях по их реализации.

Получены следующие рекомендации от участников анкетирования:

Создать общедоступную электронную форму для подачи предложений по улучшениям.

№	Вопрос	Ответ
1	К какой категории Вы относитесь?	☐ Учащийся ☐ Работник ☐ Родитель
2	Есть ли у Вас идеи по улучшению процессов образовательной организации (гардероб, столовая, библиотека и т. д.)?	☐ Да, часто возникают ☐ Да, иногда что-то приходит в голову ☐ Редко, но возникают ☐ Нет
3	Подавали ли Вы идеи по улучшениям?	☐ Да, часто и идеи реализуются ☐ Да, но идеи не реализуются ☐ Нет, не знаю как подавать ☐ Нет, просто нет идей
4	Понятны ли, какие шаги нужно сделать чтобы подать новую идею?	☐ Да, я всегда знаю как подать идею ☐ Да, я знаю кому сказать об идее ☐ Делюсь идеями с теми, кто готов услышать ☐ Нет
5	После подачи идеи понятен ли статус внедрения вашей идеи?	☐ Да, я всегда знаю на каком этапе реализации находится моя идея ☐ Да, я могу всегда спросить у сотрудника школы или ответственного за реализацию ☐ Нет, статус непонятен, но иногда вижу что мои идеи реализовались ☐ Нет, идеи не реализуются
6	Известны ли Вам, какие новые идеи реализуются в школе?	☐ Да, информация в открытом доступе ☐ Да, знаю об основных идеях, узнаю на родительском собрании/педсовете ☐ Иногда узнаю в личных разговорах с родителями, детьми, учителями ☐ Нет
7	Как долго рассматриваются новые идеи?	☐ до 1 месяца ☐ в рамках 1 квартала ☐ в рамках 1 года ☐ не знаю

План мероприятий

Легенда статуса:

- ◔ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ
- ◑ ВНЕДРЕНО, НО ОЦЕНКА НЕ ПРОВЕДЕНА
- ◕ ВНЕДРЕНО, ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА
- ● МЕРОПРИЯТИЯЕ РЕАЛИЗОВАНО
- ⊕ СРОК НЕ НАСТУПИЛ

План мероприятий по реализации проекта «Бережливая школа»

Утверждаю

И.о. директора МАОУ "СШ №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина" Лукашевич Ж.А.
_____ /Лукашевич Ж.А.


«21» июня 2024 г.

Легенда статуса:


- ◔ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ
- ◑ ВНЕДРЕНО, НО ОЦЕНКА НЕ ПРОВЕДЕНА
- ◕ ВНЕДРЕНО, ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА
- ● МЕРОПРИЯТИЯЕ РЕАЛИЗОВАНО
- ⊕ СРОК НЕ НАСТУПИЛ

№	Описание проблемы	№	Причина	№	Мероприятие	Ожидаемый эффект,	Ответственный	Начало	Окончание	Статус	Примечание
Направление «Система ППУ»											
1.	непонимание как и кому адресовать возникшую идею	1	отсутствие единого алгоритма подачи и реализации идей участников оразовательного процесса	1	Создание и размещение на информационном стенде школы плаката с куар кодом для подачи ППУ	ВВП 14 дней	Барабанщикова Е.В.	21.06.2024	01.07.2024	●	
2	потеря идеи в чатах										
3	забывание про рассмотрение предложенной идеи			2	Разработка и утверждение положения об ответственных лицах и сроках рассмотрения ППУ	Количество поданных ППУ на 1 участника образовательных отношений - 1 человек	Гераничева С.Ю.	15.07.2024	02.08.2024	●	
4	непонимание статуса рассмотрения предложенной идеи			3	Публикация Положения на сайте ОО для информарования участников образовательного процесса		Шевченко Е.И.	05.08.2024	08.08.2024		
5	длительный процесс рассмотрения идеи									●	
6	необходимость повторного обращения для уточнения статуса поданной идеи			4	Информрование автора ППУ о внедрении/отказе от внедрения ППУ		Захарова Е.Е.	09.08.2024	23.08.024		
7	игнорирование идеи									●	

Карта текущего состояния
процесса «Система подачи ППУ»

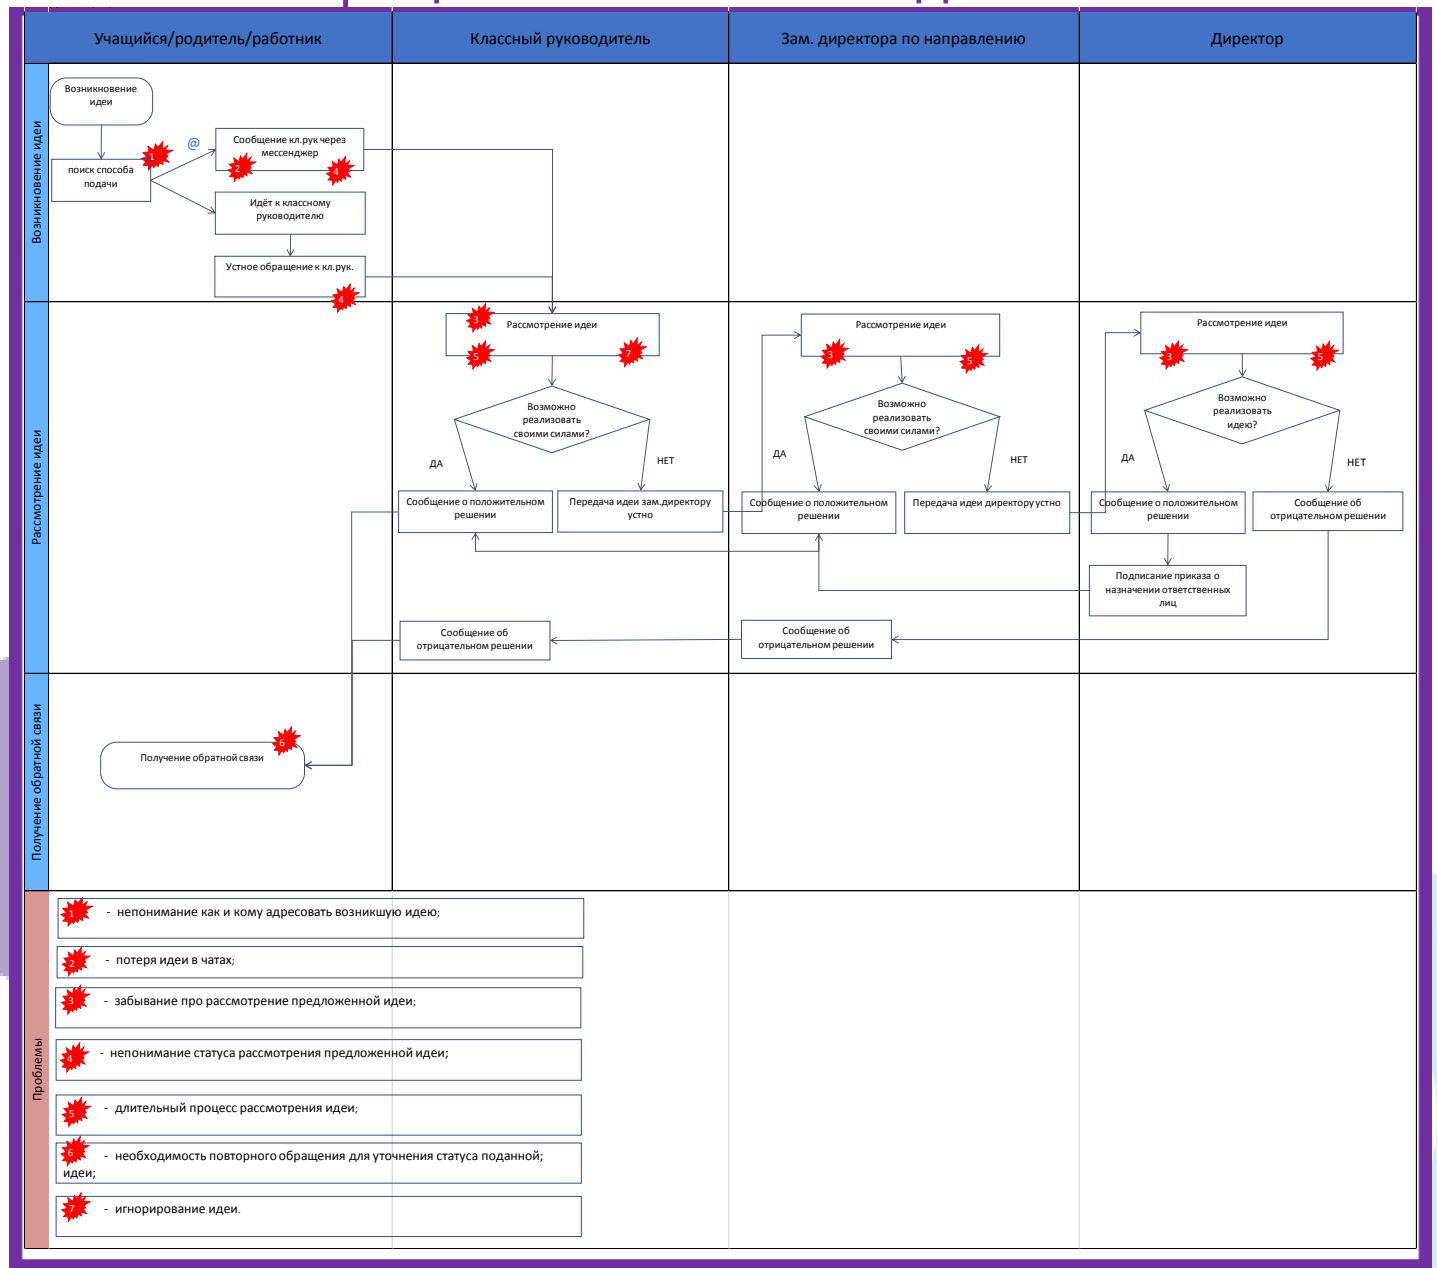

Карта целевого состояния
процесса «Система подачи ППУ»

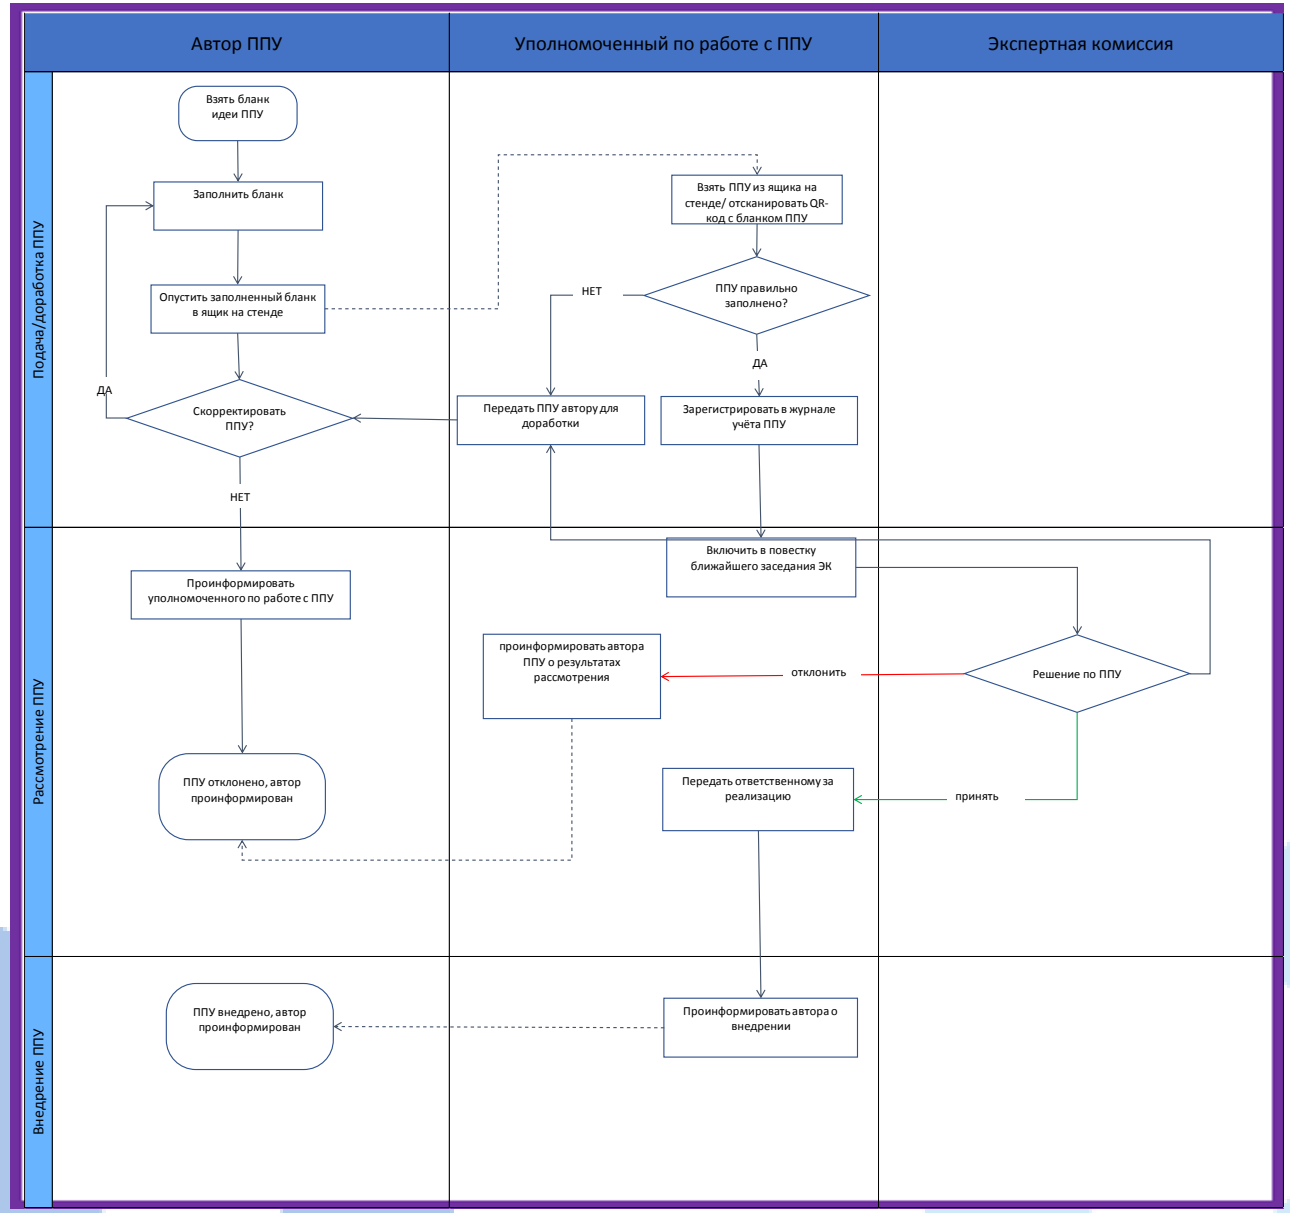

Карточка проекта

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ
Кузовлева Н.В.
подпись

«Реализация типового решения «Система подачи ППУ» в МАОУ «СШ №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Кузовлева Наталия Валериевна
Клиенты процесса: участники образовательного процесса
Периметр проекта: МАОУ «СШ №12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина»
Границы процесса: от подачи предложения по улучшению до обратной связи от ответственного лица.
Владелец процесса: заместитель директора Шевченко Е.И.
Руководитель проекта: Барабанщикова Е.В., учитель
Команда проекта: Э.А. Леденева, О.Ю. Ролдугина, А.Л. Милякова, Н.Н. Почитаева, О.С. Понарина, Е.И. Шевченко, С. Шевченко, Р.А. Харькова, В. Бартенев

2. Основание выбора

Описание причин выбора данного направления для оптимизации.

- непонимание схемы подачи предложений;
- стеснение участников образовательного процесса публично оглашать свои предложения;
- замалчивание проблем в силу низкой вовлеченности
- участников образовательного процесса в развитии школы.

2. Цели и плановый эффект


Наименование цели	Факт	Цель
1. Время протекания процесса (ВПП) подачи ППУ (дни)	-	14
2. Количество поданных ППУ на 1 участника образовательных отношений (ед./чел.)	-	1
Уровень удовлетворенности процессом организации системы ППУ, %	59	80

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Окончание
1. Старт проекта	01.04.24	26.04.24
2. Диагностика и целевое состояние • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего и целевого состояния	27.04.24 27.04.24 06.05.24	31.05.24 03.05.24 31.05.23
3. Разработка решений • Разработка плана мероприятий • Защита плана мероприятий	03.06.24 03.06.24 14.06.24	14.06.24 14.06.24 14.06.24
4. Реализация плана мероприятий • Достигнутое состояние (фото)	17.06.24 19.08.24	23.08.24 23.08.24
5. Закрепление результатов и закрытие проекта • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации (3-5 слайдов) • Совещание по защите результатов	26.08.24 26.08.24 09.09.24 13.09.24	13.09.24 06.09.24 13.09.24 13.09.24
6. Окончание проекта		13.09.24

Результаты итогового анкетирования

В результате реализации плана мероприятий достигнута положительная динамика по планируемым показателям.

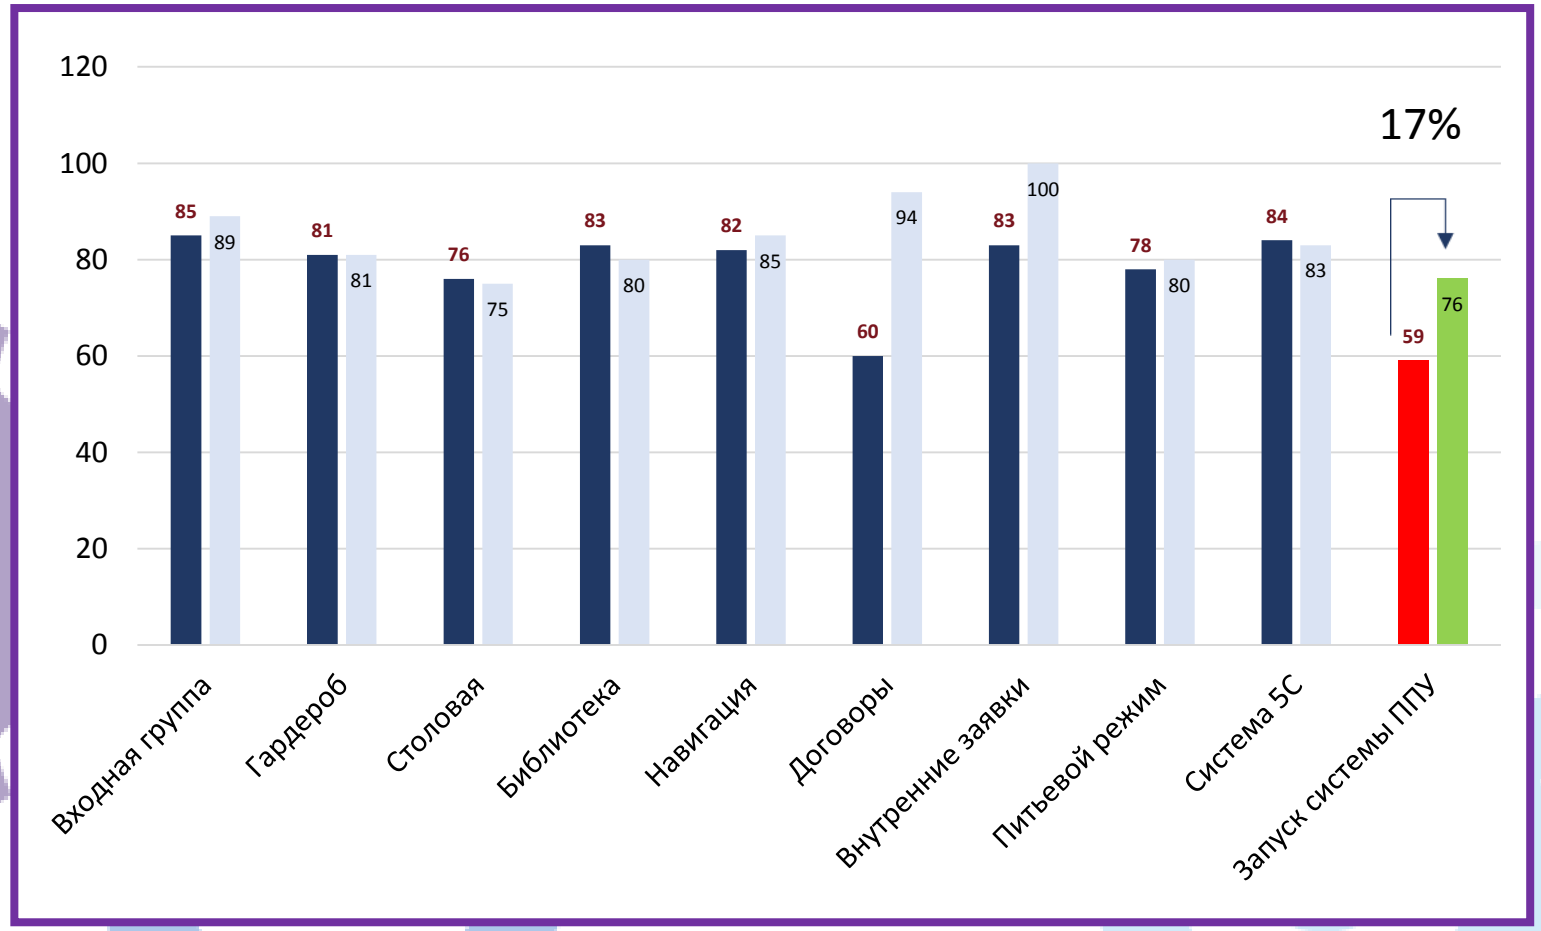

Состояние процесса «Система подачи ППУ»

ДО

ФОТО 1: возникновение идеи



ФОТО 2: поиск способа подачи идеи



ФОТО 3: сообщение идеи классному руководителю через мессенджеры




ФОТО 4: устное обращение к классному руководителю




ФОТО 5: передача идеи заместителю директора



ФОТО 6: передача идеи директору



ФОТО 7: подписание директором приказа о назначении ответственных лиц




ФОТО 8: сообщение о положительном решении заместителю директора



ФОТО 9: сообщение о положительном решении классному руководителю



ПОСЛЕ

ФОТО 1: возникновение идеи



ФОТО 2: подача предложения (сканирование QR-кода)





ФОТО 3: подача предложения (заполнение бумажной формы)



Yandex Forms

ФОТО 4: Заполнение онлайн формы

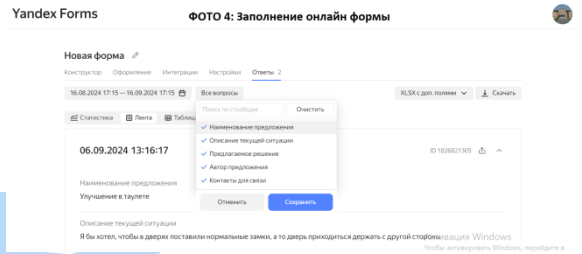


ФОТО 5: регистрация предложения в журнале по ППУ

Дата регистрации	Номер ППУ	ФИО автора	Название ППУ	Решение экспертной комиссии		Ответственный за реализацию	Срок реализации	Статус реализации	Комментарии
				Статус	Дата				
27.07.2024	1	Барабашникова Екатерина Владимировна	Подачи ППУ	Принято к внедрению	27.07.2024	Барабашникова Е.В.	01.09.2024	реализовано	
03.09.2024	2	Калинина Софья Николаевна	Школьный маршрут	Принято к внедрению	05.09.2024	Шевченко Е.Н.	13.09.2024	реализовано	




ФОТО 7: рассмотрение заявки рабочей группой, принятие решения о реализации

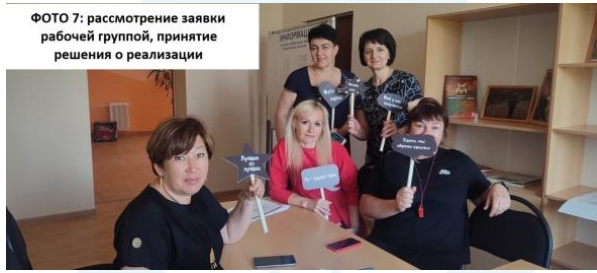


ФОТО 8: назначение ответственного лица за реализацию ППУ



ФОТО 9: реализация ППУ



ФОТО 10: получение обратной связи





Подробнее о реализации проекта

ФИО ответственного:
Барабанщикова Екатерина Владимировна

почта: ekaterinabar86@mail.ru

контактный телефон: 8 (950) 806-78-87
